



Operation Number: **HA-L1003**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/6/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/23/2014**
Country Representative validation date: **06/24/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rural Supply Chain Development Program	Loan Number:	1794/SF-HA,2393/GR-HA
Executing Agency (EA):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL,MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL		
Team Leader:	Le Pommellec,Marion	Sector/Subsector:	AGRIBUSINESS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI ,REPUBLIQUE D' HAITI		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-L1003	\$17,800,000.00	\$17,800,000.00	\$164,000.00	\$0.00	\$17,964,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-L1003	\$17,800,000.00	\$11,631,696.00	65.35%	\$6,168,304.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	


Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

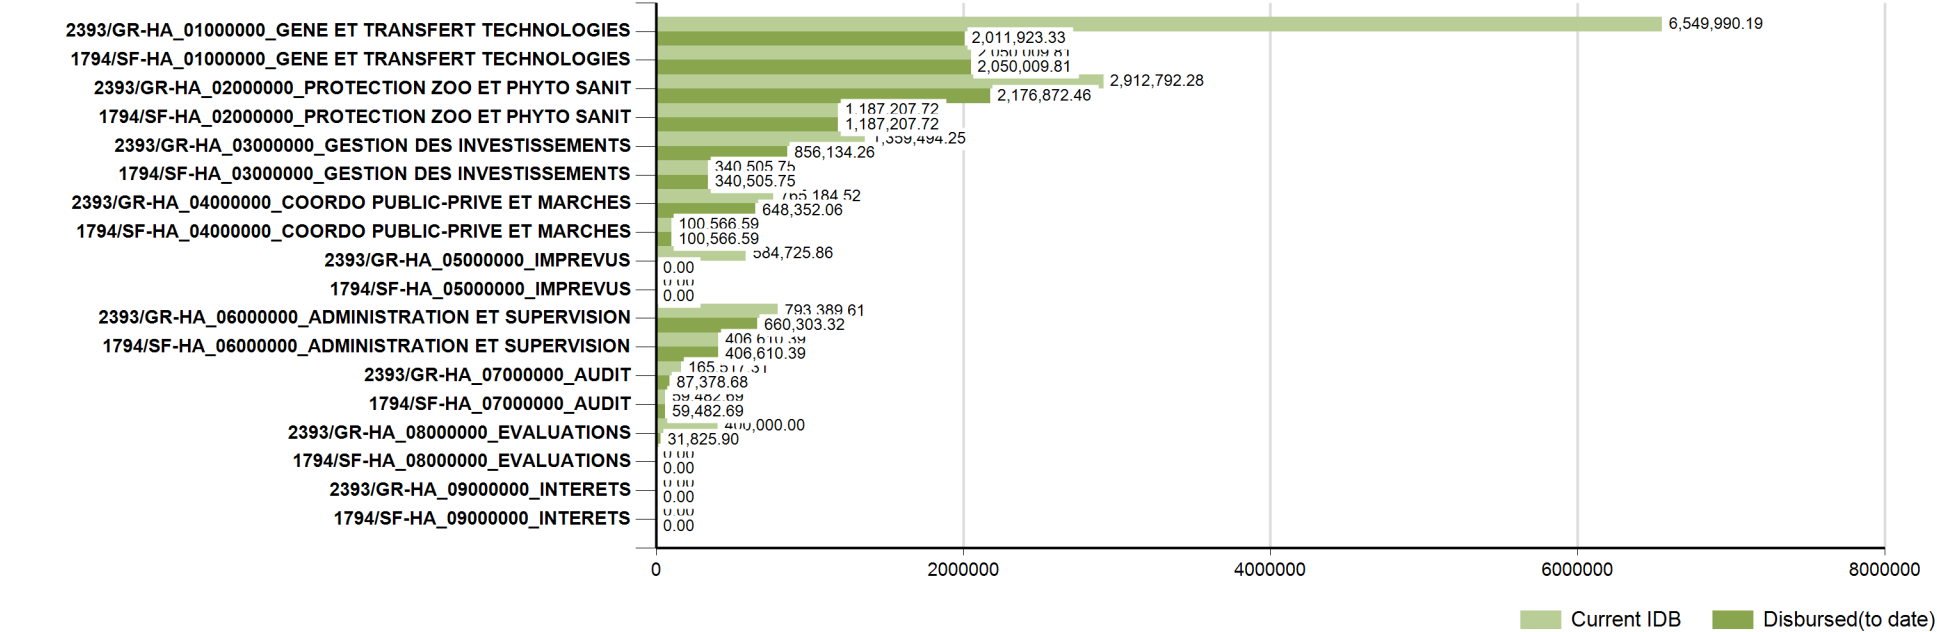

Expense Categories by Operation (cumulative values)

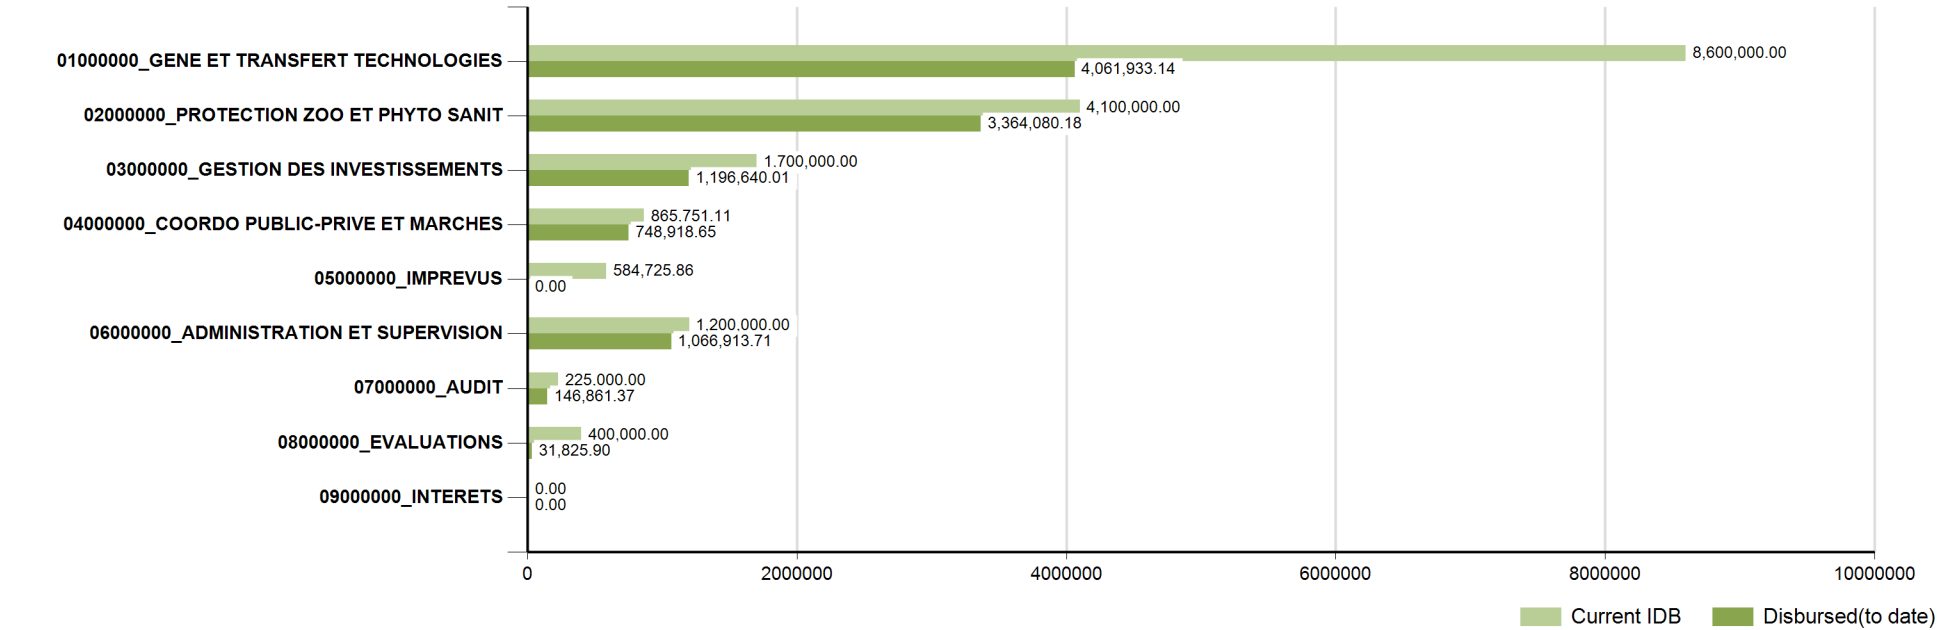

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les secteurs d'activité prioritaires en milieu rural.										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations					
1.1 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les filières Fruits (références = mangue, avocat, chadèque, citron, mandarine, orange)		Gourdes/an/exploitation -type	2,818.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	2,818.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00
							P(a)	2,818.00	3,522.00	3,522.00	2,818.00
							A	2,818.00	0.00	2,818.00	

1.2 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les filières Maraîchage (références = carotte, chou, tomate, oignon)		Gourdes/an/exploitation-type	18,117.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	18,117.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00
						P(a)	18,117.00	22,646.00	22,646.00	18,117.00	
						A	18,117.00	0.00	18,117.00		
1.3 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les filières Huiles Essentielles (référence = vétiver)		Gourdes/an/exploitation-type	13,050.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	13,050.00	16,312.00	16,312.00	16,312.00
						P(a)	13,050.00	16,312.00	16,312.00	13,050.00	
						A	13,050.00	0.00	13,050.00		

1.4 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les filières Tubercules (références = patate douce, pomme de terre, igname)		Gourdes/an/exploitation-type	55,293.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	55,293.00	69,117.00	69,117.00	69,117.00
							P(a)	55,293.00	69,117.00	69,117.00	55,293.00
							A	55,293.00	0.00	55,293.00	
1.5 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les filières Céréales (références = maïs et haricot)		Gourdes/an/exploitation-type	8,420.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	8,420.00	10,525.00	10,525.00	12,525.00
							P(a)	8,420.00	10,525.00	10,525.00	8,420.00
							A	8,420.00	0.00	8,420.00	

1.6 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans la filière Oeufs		Gourdes/an/exploitation-type	169,600.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	169,600.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00
							P(a)	169,600.00	212,000.00	212,000.00	169,600.00
							A	169,600.00	0.00	169,600.00	
1.7 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans la filière Lait		Gourdes/an/exploitation-type	14,100.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	14,100.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00
							P(a)	14,100.00	17,625.00	17,625.00	14,100.00
							A	14,100.00	0.00	14,100.00	

1.8 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans les filières Viande (référence = poule pays, bovin, porc)		Gourdes/an/exploitation-type	5,323.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	5,323.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00
							P(a)	5,323.00	6,654.00	6,654.00	5,323.00
							A	5,323.00	0.00	5,323.00	
1.9 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans la filière Banane		Gourdes/an/exploitation-type	157,500.00	2005	Evaluation finale de l'impact économique	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consultant devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi-évaluation de ce programme (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogrammation du	P	157,500.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00
							P(a)	157,500.00	196,875.00	196,875.00	157,500.00
							A	157,500.00	0.00	157,500.00	

1.10 Valeur ajoutée supplémentaire créée dans la filière Café		Gourdes/a n/exploitati on-type	13,200.00	2005	Evaluation finale de l'impact économiq ue	Ce résultat est plutôt un impact. Tel que précisé dans la section "issues", un consulta nt devait être recruté en 2011 pour finaliser le cadre de suivi- évaluati on de ce program me (seuls les produits ont pour l'instant fait l'objet d'une reprogra mmation du	P	13,200.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
							P(a)	13,200.00	16,500.00	16,500.00	13,200.00
							A	13,200.00	0.00	13,200.00	

Outcome:

2 Accès amélioré aux services publics vétérinaires et phytosanitaires

Observation:

Nombre d'agriculteurs et d'éleveurs qui bénéficient directement des services publics vétérinaires et phytosanitaires

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009	2012	2013	EOP
2.1 Agriculteurs et éleveurs qui bénéficient directement des services publics vétérinaires et phytosanitaires: vaccination des animaux, identification infalsifiable des bovins, lutte contre le scolyte du café, la mouche de la mangue et la fourmi folle	RF	Farmers	0.00	2006	Evaluation finale		P			
							P(a)			1,000,000.00
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Génération et transfert de technologies agricoles appropriées		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Centres de Recherche & Développement fonctionnels	Centres	P		5.00	P		3,078,040.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	200,000.00	2,562,017.00
		A	0.00	4.00	A	165,000.00	2,562,017.00
Collections botaniques et catalogues de races établis	Collections et catalogues	P		10.00	P		362,251.00
		P(a)	5.00	6.00	P(a)	96,000.00	260,751.00
		A	0.00	4.00	A	29,431.00	159,531.00
Technologies améliorées élaborées et prêtes à être diffusées	Technologies	P		30.00	P		2,745,848.00
		P(a)	5.00	7.00	P(a)	800,000.00	2,421,657.00
		A	1.00	1.00	A	334,520.00	1,066,244.00
Systèmes innovants de conditionnement et de commercialisation fonctionnels	Systèmes	P		2.00	P		635,015.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Services de production de semence de base opérationnels	Services	P		4.00	P		300,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	1,000.00
		A		0.00	A		1,000.00
Politique/Cadre légal/Business Plan/Manuel d'Opération pour la recherche agricole établis	Politique	P			P		
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	60,000.00	488,942.00
		A	1.00	1.00	A	52,374.00	89,374.00
Protection zoo et phytosanitaire et traçabilité		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Système national d'épidémio-surveillance animale amélioré	Système	P	1.00	1.00	P		1,104,312.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	200,000.00	652,454.00
		A	1.00	1.00	A	138,280.00	652,454.00
Système national d'épidémio-surveillance végétale amélioré	Système	P	1.00	1.00	P		596,250.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	400,000.00	431,646.00
		A	0.00	0.00	A	94,114.00	431,646.00
Animaux (re)vaccinés (contre la Peste Porcine Classique, le Charbon Bactérien et la Maladie de NewCastle)	Animaux	P		5,061,541.00	P		2,110,866.00
		P(a)	1,000,000.00	4,586,820.00	P(a)	400,000.00	2,100,533.00
		A	500,000.00	4,586,820.00	A	217,832.00	2,100,533.00
Service de défense des cultures amélioré	Service	P	1.00	1.00	P		1,038,760.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	44,000.00	778,974.00
		A	0.00	0.00	A	185,003.00	778,974.00
Personnel de haut niveau formé (formation courte en Université étrangère)	Cadres	P	4.00	8.00	P	80,000.00	240,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)	0.00	177,200.00
		A	4.00	4.00	A	177,200.00	177,200.00
Bureaux/stations/postes de quarantaine fonctionnels	Stations/postes	P	1.00	1.00	P		765,260.00
		P(a)	3.00	4.00	P(a)	300,000.00	644,203.00
		A	1.00	2.00	A	117,101.00	403,203.00
Laboratoire central de Tamarinier et ses annexes réhabilités	Laboratoire	P	1.00	1.00	P		576,000.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	600,000.00	437,362.00
		A	0.00	0.00	A	57,000.00	323,362.00
Cadre légal élaboré et soumis à la Primature	Cadre légal	P		1.00	P		20,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	7,120.00
		A		1.00	A		7,120.00

Bovins traçables (identifiés avec boucle et carnet infalsifiable)	Bovins	P			P		
		P(a)	1,300,000.00	1,300,000.00	P(a)	400,000.00	546,226.00
		A	120,000.00	120,000.00	A	25,103.00	100,103.00
Systèmes solaires de chaîne de froid installés	Systèmes	P			P		
		P(a)	25.00	151.00	P(a)	350,000.00	1,525,000.00
		A	0.00	26.00	A		290,000.00
Nouveau cadre institutionnel pour la protection zoo et phytosanitaire et l'innocuité des aliments établi (Politique sous-sectorielle + législation + schéma institutionnel + plans stratégique et opérationnel quinquennaux)	Cadre institutionnel	P			P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	150,000.00	104,235.00
		A	1.00	1.00	A	104,235.00	104,235.00

Gestion stratégique des investissements publics dans les filières rurales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Budget d'investissement annuel élaboré conformément aux directives	Budget d'investissement annuel	P	1.00	3.00	P	200,000.00	1,059,410.48
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	262,937.48
		A		0.00	A	23,235.00	262,937.48
Patrimoine documentaire restauré	Patrimoine documentaire	P		1.00	P		84,625.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	24,621.00
		A		0.00	A		24,621.00
Personnel de haut niveau formé (avec Maîtrise)	Cadres	P		3.00	P		193,391.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	189,248.00
		A		3.00	A		189,248.00
Etudes de préinvestissement du nouveau programme "Artibonite" réalisées	Etudes	P			P		
		P(a)	8.00	7.00	P(a)	800,000.00	935,221.00
		A	7.00	7.00	A	97,120.00	97,120.00
Documents stratégiques (de politique, de réforme, programmatiques, de reddition de comptes) réalisés	Documents	P			P		
		P(a)	5.00	9.00	P(a)	300,000.00	911,542.00
		A	7.00	9.00	A	298,410.00	402,410.00
Enquête annuelle d'estimation de la production agricole réalisée	Enquête	P			P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	130,000.00	249,499.00
		A	1.00	1.00	A	82,514.00	202,514.00
Renforcement institutionnel et coordination public-privé		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Outils & travaux divers (stratégie d'entreprise, plan d'affaires, rating de risque financier, états financiers audités ou non, étude de marché, stratégie marketing¿) réalisés pour des entreprises	Outils et travaux	P		50.00	P		596,306.00
		P(a)	0.00	22.00	P(a)	50,000.00	478,982.00
		A		22.00	A	30,000.00	478,982.00
Organisations professionnelles appliquant le package des outils et procédures de bonne gestion et gouvernance	Organisations professionnelles agricoles	P		5.00	P		576,714.00
		P(a)	0.00	21.00	P(a)	50,000.00	252,634.00
		A		21.00	A	58,000.00	252,634.00
Avant projets de loi soumis à la Primature	Avant-projets	P		3.00	P		20,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	40,000.00	12,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	12,000.00
Administration, suivi-évaluation, audit, non affecté / imprévus							

Other Cost		2013	Cost
Administration, suivi-évaluation, audit, non affecté / imprévus, frais financiers, + A ANNULER	P	\$3,014,000.00	\$4,091,522.29
	P(a)	\$1,000,000.00	\$2,597,747.29
	A	\$230,023.00	\$1,390,545.29

Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$3,294,000.00	\$20,194,570.77
	P(a)	\$6,370,000.00	\$19,053,751.77
	A	\$2,516,495.00	\$12,560,007.77

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
